



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

commissario straordinario  
**BRESCIA CAFFARO**

## PROGETTAZIONE ESECUTIVA

### Interventi di decommissioning, bonifica e MISP presso lo stabilimento Caffaro Brescia (BS) Stralcio di Prima Fase

SITO: **Stabilimento Caffaro Brescia**

CIG 9916350EE1  
CUP F84D2000014001

STAZIONE APPALTANTE:

Commissario Straordinario Sito  
Interesse Nazionale "Brescia Caffaro"

via G. Marconi, 12 25128 Brescia  
Tel. 030.2978064

APPALTATORE

Raggruppamento Temporaneo di  
Imprese (R.T.I.)



PROGETTISTI INCARICATI DALL'RTI

Raggruppamento Temporaneo di  
Progettisti (R.T.P.)



RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: Ing. Jean Pierre Davit, WSP Italia S.r.l.  
RESPONSABILE CANTIERIZZAZIONE ED ATTIVITA' PROPEDEUTICHE: Ing. Gianbattista Attinasi, NCE S.r.l.  
RESPONSABILE DECOMMISSIONING E DEMOLIZIONI: Ing. Massimiliano Alfio Bazzichi, WSP Italia S.r.l.  
RESPONSABILE INTERVENTI DI BONIFICA/MISP: Ing. Marco Gianluigi Morando, NCE S.r.l.

GRUPPO PROGETTAZIONE INTERNO:

WSP Italia S.r.l.  
ing. Silvia Cestaro (Project Manager)  
ing. Luna Maldì  
ing. Marianna Trevisan


NCE S.r.l.  
ing. Marta Mariani

## Cronoprogramma


Codice elaborato

C-052-23634793-WP.P2-DEM-PG-3

3	Set. 2025	Revisione	NCE-WSP	Informazioni qualità	
2	Lug. 2025	Revisione	NCE-WSP	Preparato da	L.C.
1	Giu. 2025	Revisione	NCE-WSP	Controllato da	M.T.
0	Feb. 2025	Prima emissione	NCE-WSP	Verificato da	A.B.
Rev.	Data	Rif. Revisione	Redatto	Approvato da	J.D.


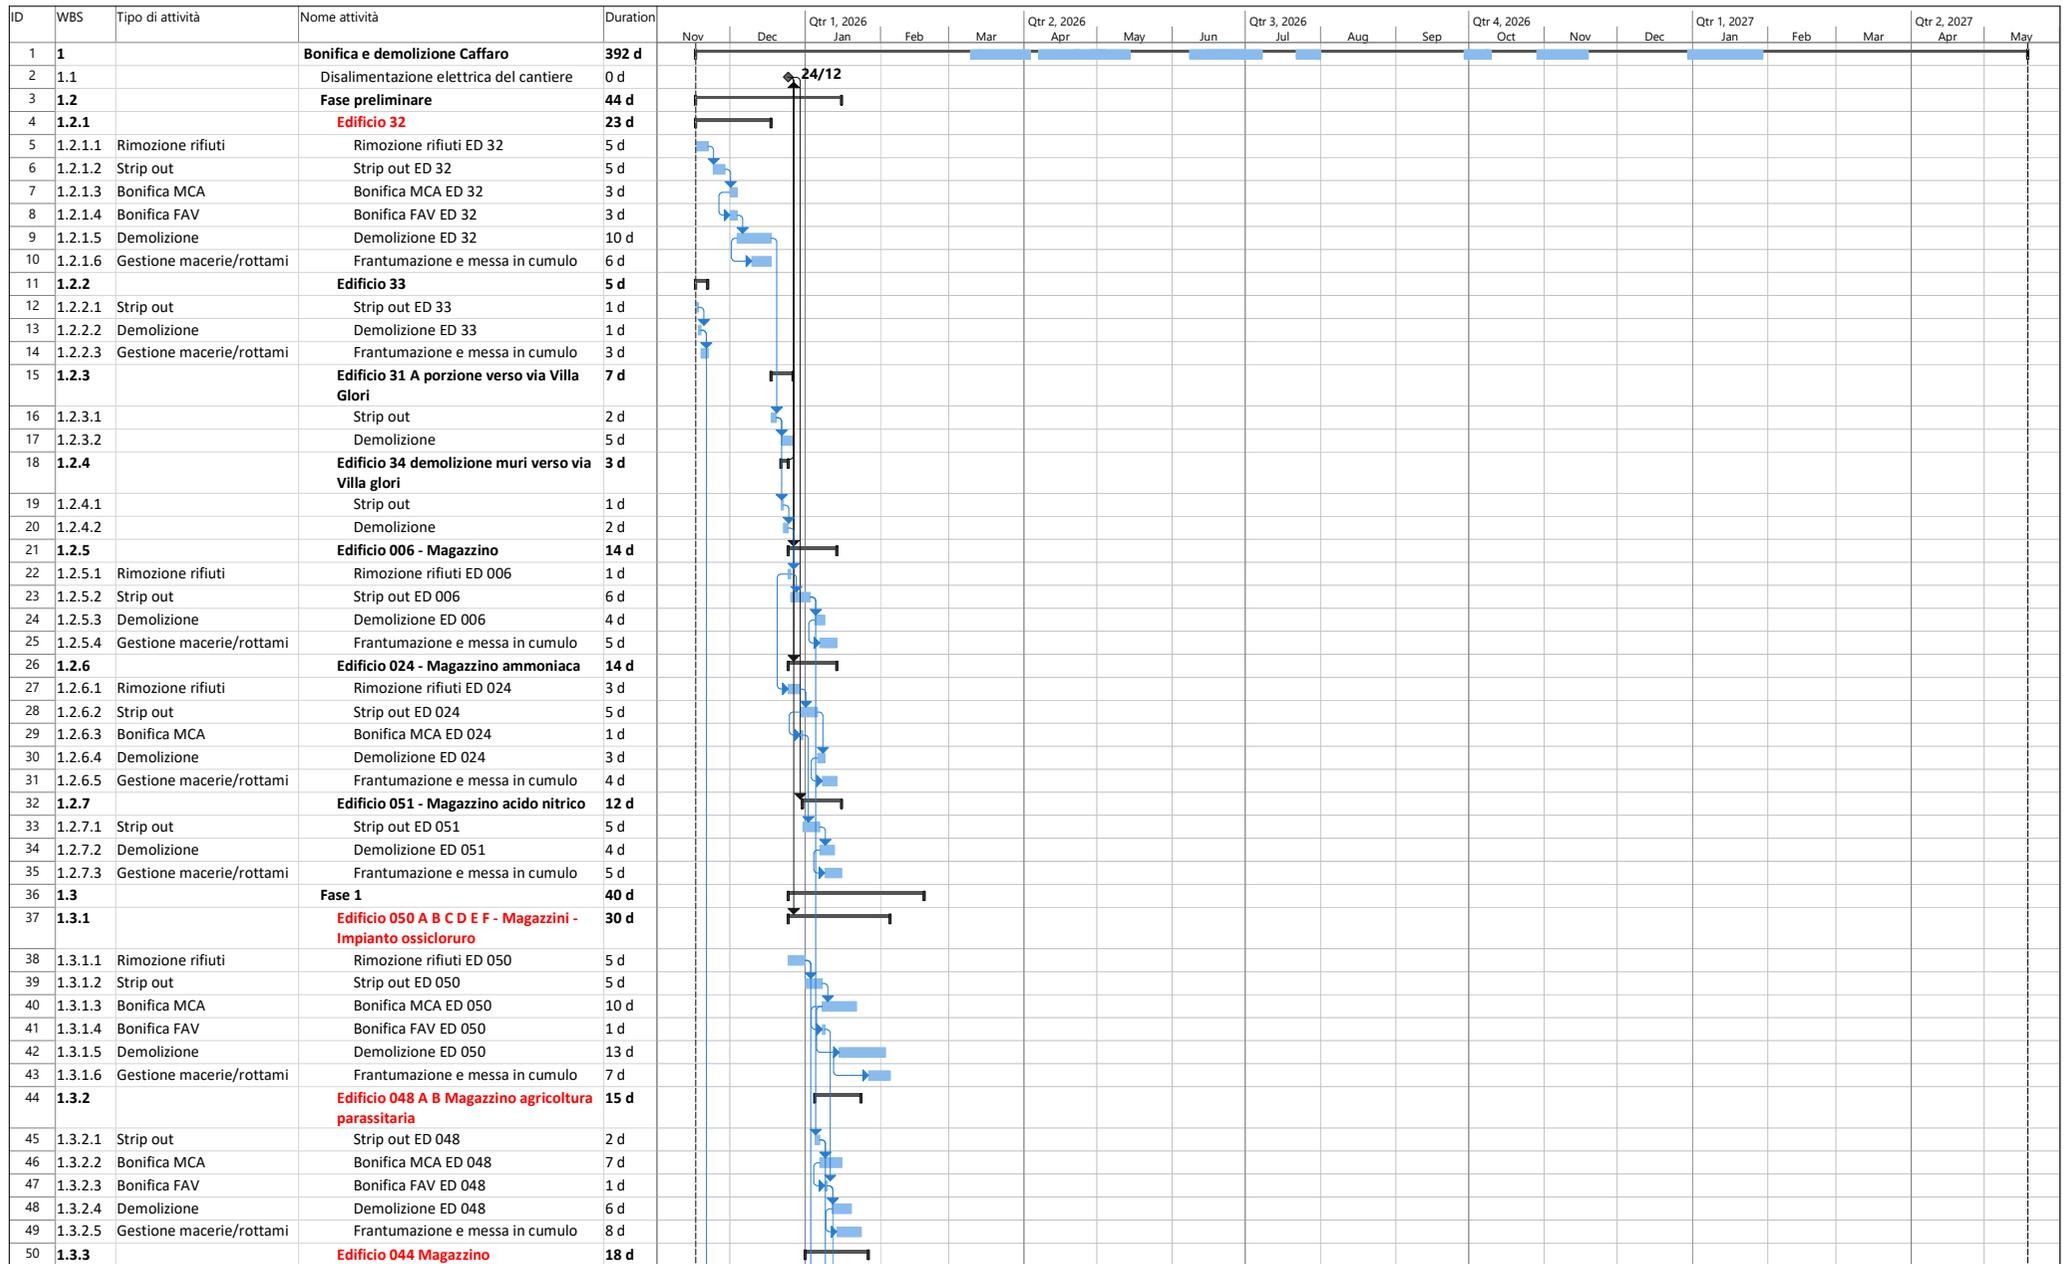


ID	WBS	Tipo di attività	Nome attività	Duration	2026					2027													
					Nov	Dec	Qtr 1, 2026 Jan	Feb	Mar	Qtr 2, 2026 Apr	May	Jun	Qtr 3, 2026 Jul	Aug	Sep	Qtr 4, 2026 Oct	Nov	Dec	Qtr 1, 2027 Jan	Feb	Mar	Qtr 2, 2027 Apr	May
51	1.3.3.1	Rimozione rifiuti	Rimozione rifiuti ED 044	1 d																			
52	1.3.3.2	Strip out	Strip out ED 044	6 d																			
53	1.3.3.3	Bonifica FAV	Bonifica FAV ED 044	2 d																			
54	1.3.3.4	Demolizione	Demolizione ED 044	6 d																			
55	1.3.3.5	Gestione macerie/rottami	Frantumazione e messa in cumulo	6 d																			
56	1.3.4		<b>Edificio 045 C D E Magazzini</b>	<b>34 d</b>																			
57	1.3.4.1	Rimozione rifiuti	Rimozione rifiuti ED 045	3 d																			
58	1.3.4.2	Strip out	Strip out ED 045	5 d																			
59	1.3.4.3	Bonifica MCA	<b>Bonifica MCA ED 045</b>	<b>20 d</b>																			
60	1.3.4.3.1	Bonifica MCA	Bonifica coperture MCA	5 d																			
61	1.3.4.3.2	Bonifica MCA	Bonifica 45E 45C	20 d																			
62	1.3.4.4	Bonifica FAV	Bonifica FAV ED 045	1 d																			
63	1.3.4.5	Demolizione	Demolizione ED 045	5 d																			
64	1.3.4.6	Gestione macerie/rottami	Frantumazione e messa in cumulo	7 d																			
65	1.4		<b>Fase 2</b>	<b>111 d</b>																			
66	1.4.1		<b>Edificio 31</b>	<b>52 d</b>																			
67	1.4.1.1	Rimozione rifiuti	Rimozione rifiuti ED 31	3 d																			
68	1.4.1.2	Strip out	Strip out ED 31	3 d																			
69	1.4.1.3	Bonifica MCA	Bonifica MCA ED 31	20 d																			
70	1.4.1.4	Bonifica FAV	Bonifica FAV ED 31	1,67 d																			
71	1.4.1.5	Demolizione	Demolizione ED 31	7 d																			
72	1.4.1.6	Gestione macerie/rottami	Frantumazione e messa in cumulo	11 d																			
73	1.4.2		<b>Edificio 29 B</b>	<b>27 d</b>																			
74	1.4.2.1	Rimozione rifiuti	Rimozione rifiuti ED 29	10 d																			
75	1.4.2.2	Strip out	Strip out ED 29 B	5 d																			
76	1.4.2.3	Demolizione	Demolizione ED 29	3 d																			
77	1.4.2.4	Gestione macerie/rottami	Frantumazione e messa in cumulo	5 d																			
78	1.4.3		<b>Edificio 29 A</b>	<b>45,67 d</b>																			
79	1.4.3.1	Rimozione rifiuti	Rimozione rifiuti ED 29A	3 d																			
80	1.4.3.2	Strip out	Strip out ED 29A	5 d																			
81	1.4.3.3	Bonifica MCA	Bonifica MCA ED 29A	7 d																			
82	1.4.3.4	Bonifica FAV	Bonifica FAV ED 29A	2 d																			
83	1.4.3.5	Demolizione	Demolizione ED 29A	7 d																			
84	1.4.3.6	Gestione macerie/rottami	Frantumazione e messa in cumulo	9 d																			
85	1.4.4		<b>Edificio 28 C</b>	<b>15 d</b>																			
86	1.4.4.1	Strip out	Strip out ED 28C	6 d																			
87	1.4.4.2	Bonifica FAV	Bonifica FAV ED 28C	5 d																			
88	1.4.4.3	Demolizione	Demolizione ED 28C	3 d																			
89	1.4.4.4	Gestione macerie/rottami	Frantumazione e messa in cumulo	1 d																			
90	1.4.5		<b>Edificio 28 AB</b>	<b>65 d</b>																			
91	1.4.5.1	Rimozione rifiuti	Rimozione rifiuti ED 28AB	10 d																			
92	1.4.5.2	Strip out	Strip out ED 28AB	9 d																			
93	1.4.5.3	Bonifica MCA	Bonifica MCA ED 28AB	15 d																			
94	1.4.5.4	Demolizione	Demolizione ED 28AB	9 d																			
95	1.4.5.5	Gestione macerie/rottami	Frantumazione e messa in cumulo	11 d																			
96	1.4.6		<b>Edificio 28 DE</b>	<b>17 d</b>																			
97	1.4.6.1	Strip out	Strip out ED 28DE	5 d																			
98	1.4.6.2	Demolizione	Demolizione ED 28 DE	7 d																			
99	1.4.6.3	Gestione macerie/rottami	Frantumazione e messa in cumulo	5 d																			
100	1.4.7		<b>Edificio 030</b>	<b>105 d</b>																			
101	1.4.7.1	Rimozione rifiuti	Rimozione rifiuti ED 030	3 d																			
102	1.4.7.2	Strip out	Strip out ED 030	3,33 d																			
103	1.4.7.3	Bonifica MCA	Bonifica MCA ED 030	10 d																			



ID	WBS	Tipo di attività	Nome attività	Duration	Nov	Dec	Qtr 1, 2026	Feb	Mar	Qtr 2, 2026	May	Jun	Qtr 3, 2026	Aug	Sep	Qtr 4, 2026	Nov	Dec	Qtr 1, 2027	Feb	Mar	Qtr 2, 2027	May
							Jan			Apr			Jul			Oct			Jan			Apr	
104	1.4.7.4	Bonifica FAV	Bonifica FAV ED 030	2 d																			
105	1.4.7.5	<b>Demolizione</b>	<b>Demolizione ED 030</b>	<b>105 d</b>																			
106	1.4.7.5.1	Demolizione	Demolizione serbatoi e impianti	4 d																			
107	1.4.7.5.2	Demolizione	Demolizione ED 030	11 d																			
108	1.4.7.5.3	Demolizione	Demolizione basamenti e bacino di contenimento	9 d																			
109	1.4.7.5.4	Gestione macerie/rottami	Frantumazione e messa in cumulo	6 d																			
110	1.4.8		<b>Edificio 034</b>	<b>50 d</b>																			
111	1.4.8.1	Rimozione rifiuti	Rimozione rifiuti ED 034	3 d																			
112	1.4.8.2	Strip out	Strip out ED 034	5 d																			
113	1.4.8.3	Bonifica MCA	Bonifica MCA ED 034	2 d																			
114	1.4.8.4	Bonifica FAV	Bonifica FAV ED 034	3 d																			
115	1.4.8.5	Demolizione	Demolizione edificio 034	12 d																			
116	1.4.8.6	Gestione macerie/rottami	Frantumazione e messa in cumulo	16 d																			
117	1.4.9		<b>Edificio 035</b>	<b>49 d</b>																			
118	1.4.9.1	Rimozione rifiuti	Rimozione rifiuti ED 035	5 d																			
119	1.4.9.2	Strip out	Strip out ED 035	5 d																			
120	1.4.9.3	Bonifica MCA	Bonifica MCA ED 035	10 d																			
121	1.4.9.4	<b>Demolizione</b>	<b>Demolizione edificio 035</b>	<b>44 d</b>																			
122	1.4.9.4.1	Demolizione	Demolizione serbatoi e impianti	4 d																			
123	1.4.9.4.2	Demolizione	Demolizione edificio 035	7 d																			
124	1.4.9.4.3	Gestione macerie/rottami	Frantumazione e messa in cumulo	15 d																			
125	1.4.10		<b>Edificio 036</b>	<b>57 d</b>																			
126	1.4.10.1	Rimozione rifiuti	Rimozione rifiuti ED 036	10 d																			
127	1.4.10.2	Strip out	Strip out ED 036	5 d																			
128	1.4.10.3	Bonifica MCA	Bonifica MCA ED 036	15 d																			
129	1.4.10.4	Bonifica FAV	Bonifica FAV ED 036	4 d																			
130	1.4.10.5		<b>Demolizione edificio 036</b>	<b>57 d</b>																			
131	1.4.10.5	Demolizione	Demolizione parti pericolanti	2 d																			
132	1.4.10.5	Demolizione	Demolizione edificio 036	8 d																			
133	1.4.10.5	Gestione macerie/rottami	Frantumazione e messa in cumulo	14 d																			
134	1.4.11		<b>Edificio 038</b>	<b>38,67 d</b>																			
135	1.4.11.1	Rimozione rifiuti	Rimozione rifiuti ED 038	10 d																			
136	1.4.11.2	Strip out	Strip out ED 038	4 d																			
137	1.4.11.3	Bonifica MCA	Bonifica MCA ED 038	8 d																			
138	1.4.11.4	Bonifica FAV	Bonifica FAV ED 038	2 d																			
139	1.4.11.5	Demolizione	Demolizione edificio 038	15 d																			
140	1.4.11.6	Gestione macerie/rottami	Frantumazione e messa in cumulo	10 d																			
141	1.4.12		<b>Edificio 037</b>	<b>21 d</b>																			
142	1.4.12.1	Rimozione rifiuti	Rimozione rifiuti ED 037	1 d																			
143	1.4.12.2	Strip out	Strip out ED 037	5 d																			
144	1.4.12.3	Bonifica FAV	Bonifica FAV ED 037	2 d																			
145	1.4.12.4	Demolizione	Demolizione edificio 037	4 d																			
146	1.4.12.5	Gestione macerie/rottami	Frantumazione e messa in cumulo	9 d																			
147	1.5		<b>Fase 3</b>	<b>339 d</b>																			
148	1.5.1		<b>Edificio 27 A D G</b>	<b>57 d</b>																			
149	1.5.1.1	Strip out	Strip out ED 27 A D G	5 d																			
150	1.5.1.2	Bonifica MCA	Bonifica MCA ED 27 A D G	20 d																			
151	1.5.1.3	Demolizione	Demolizione edificio 27 A D G	9 d																			



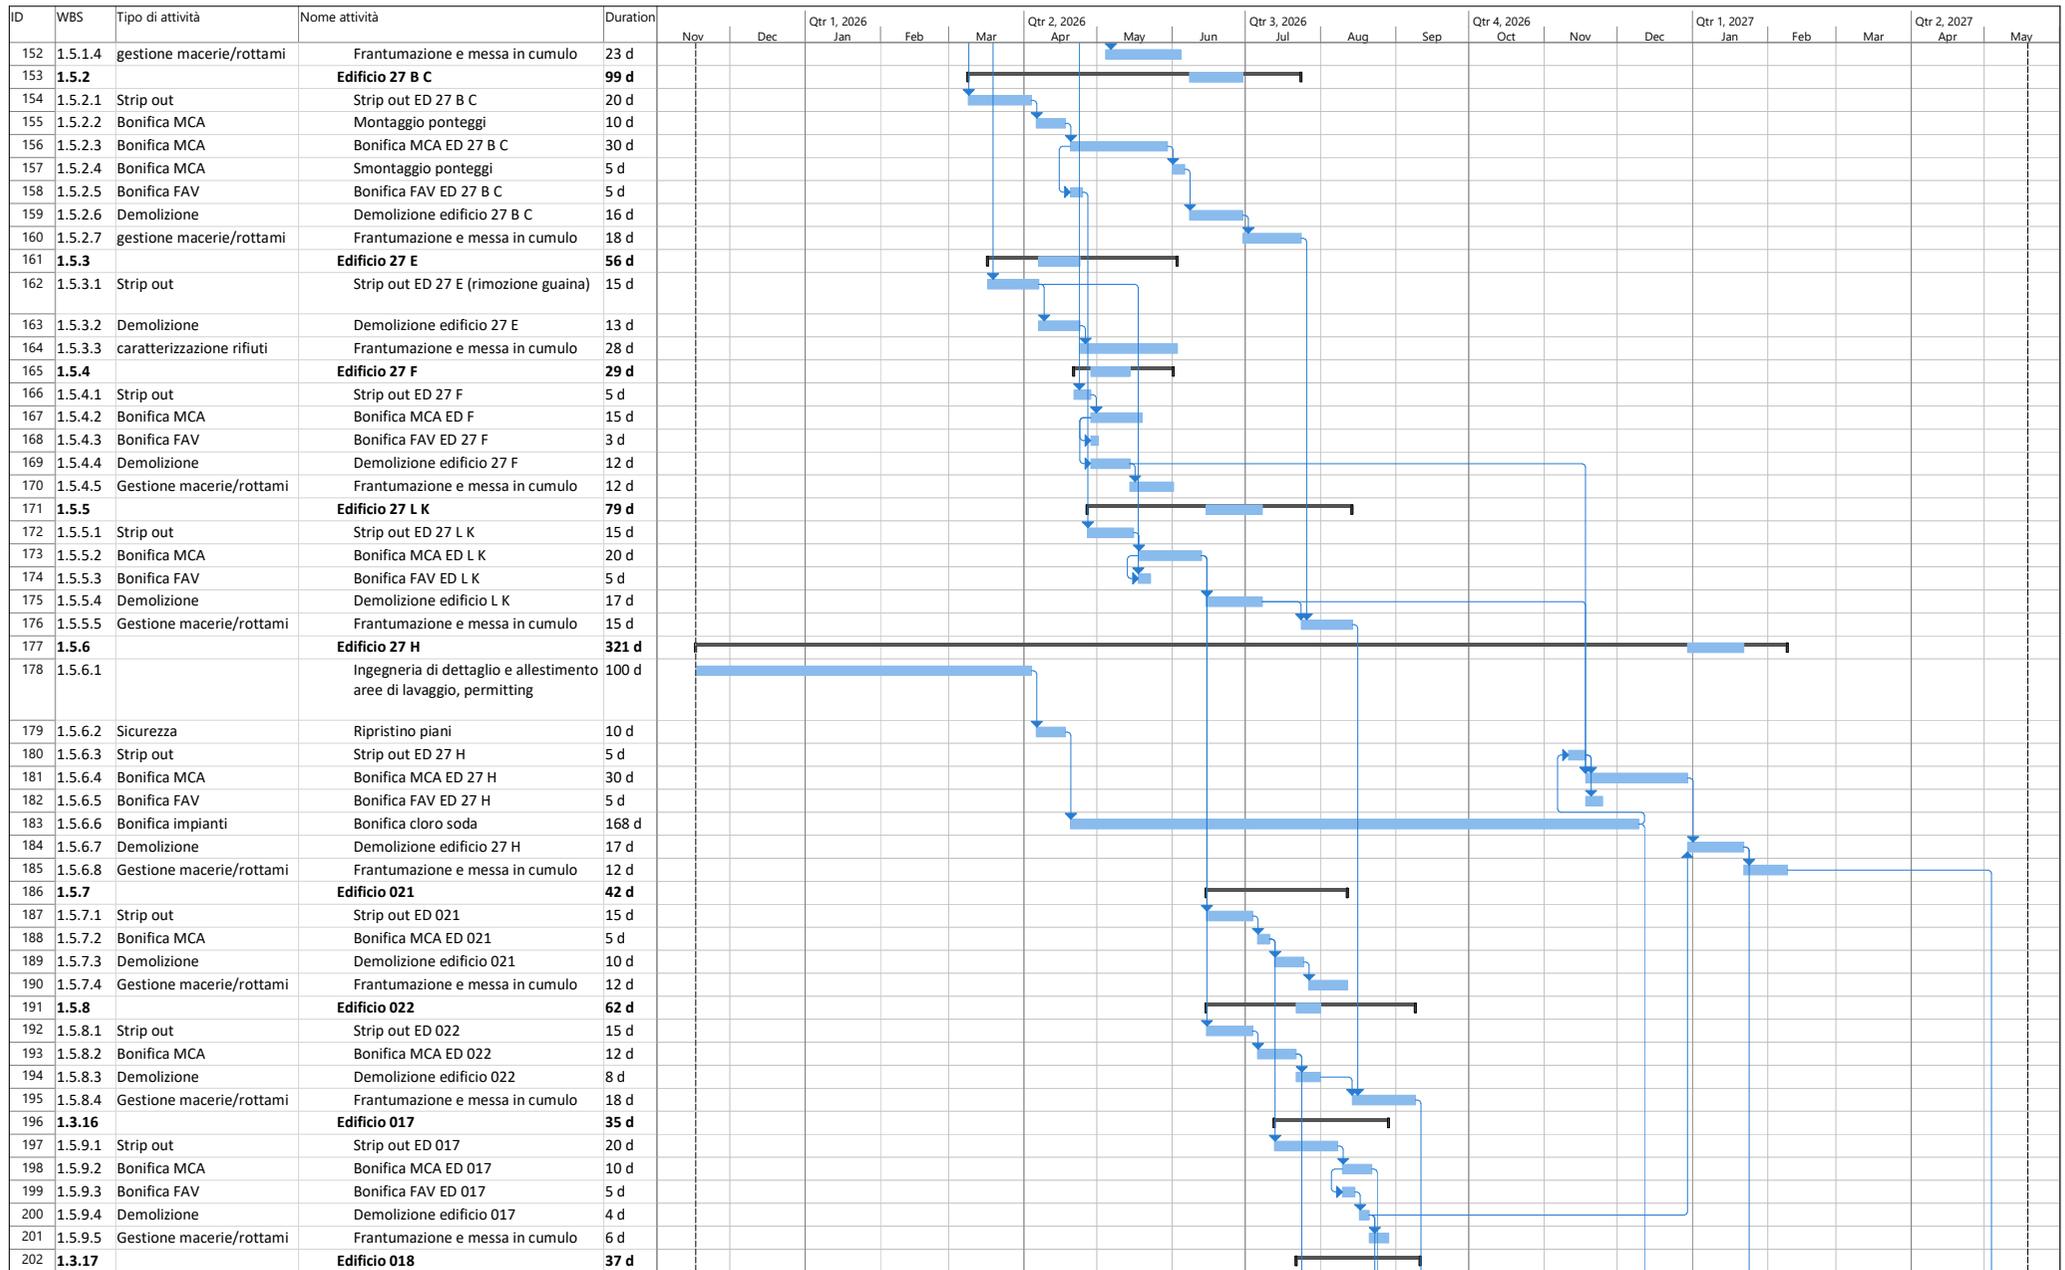

ID	WBS	Tipo di attività	Nome attività	Duration	Nov		Dec		Qtr 1, 2026			Qtr 2, 2026			Qtr 3, 2026			Qtr 4, 2026			Qtr 1, 2027			Qtr 2, 2027	
					Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May				
203	1.5.10.1	Strip out	Strip out ED 018	2 d																					
204	1.5.10.2	Bonifica MCA	Bonifica MCA ED 018	3 d																					
205	1.5.10.3	Demolizione	Demolizione edificio 018	2 d																					
206	1.5.10.4	Gestione macerie/rottami	Frantumazione e messa in cumulo	2 d																					
207	1.3.15		<b>Edificio 016</b>	<b>57 d</b>																					
208	1.5.11.1	Rimozione rifiuti	Rimozione rifiuti ED 016	22 d																					
209	1.5.11.2	Strip out	Strip out ED 016	15 d																					
210	1.5.11.3	Bonifica MCA	Bonifica MCA ED 016	25 d																					
211	1.5.11.4	Bonifica FAV	Bonifica FAV ED 016	5 d																					
212	1.5.11.5	Demolizione	Demolizione edificio 016	7 d																					
213	1.5.11.6	Gestione macerie/rottami	Frantumazione e messa in cumulo	15 d																					
214	1.5.12		<b>Edificio 013</b>	<b>112 d</b>																					
215	1.5.12.1	Strip out	Strip out ED 013	5 d																					
216	1.5.12.2	Bonifica MCA	Bonifica MCA ED 013	2 d																					
217	1.5.12.3	Bonifica FAV	Bonifica FAV ED 013	2 d																					
218	1.5.12.4	Demolizione	Demolizione edificio 013	3 d																					
219	1.5.12.5	Gestione macerie/rottami	Frantumazione e messa in cumulo	9 d																					
220	1.5.13		<b>Edificio 42</b>	<b>120 d</b>																					
221	1.5.13.1	Strip out	Strip out ED 042	5 d																					
222	1.5.13.2	Demolizione	Demolizione edificio 042	4 d																					
223	1.5.13.3	Gestione macerie/rottami	Frantumazione e messa in cumulo	7 d																					
224	1.5.14		<b>Edificio 39</b>	<b>125 d</b>																					
225	1.5.14.1	Strip out	Strip out ED 39	5 d																					
226	1.5.14.2	Bonifica FAV	Bonifica FAV ED 39	7 d																					
227	1.5.14.3	Demolizione	Demolizione edificio 39	2 d																					
228	1.5.14.4		Bonifica serbatoi CI	15 d																					
229	1.5.14.5	Gestione macerie/rottami	Frantumazione e messa in cumulo	15 d																					
230	1.5.15		<b>Edificio 041</b>	<b>17 d</b>																					
231	1.5.15.1	Strip out	Strip out ED 041	5 d																					
232	1.5.15.2	Bonifica MCA	Bonifica MCA ED 041	4 d																					
233	1.5.15.3	Demolizione	Demolizione edificio 041	2 d																					
234	1.5.15.4	Gestione macerie/rottami	Frantumazione e messa in cumulo	2 d																					
235	1.5.16		<b>Edificio 40</b>	<b>110 d</b>																					
236	1.5.16.1	Demolizione	Demolizione edificio 40	5 d																					
237	1.5.16.2	Gestione macerie/rottami	Frantumazione e messa in cumulo	9 d																					
238	1.5.17		<b>Edificio 43</b>	<b>59 d</b>																					
239	1.5.17.1	Strip out	Strip out ED 43	10 d																					
240	1.5.17.2	Bonifica MCA	Rimozione fibrocemento no MCA	4 d																					
241	1.5.17.3	Demolizione	Demolizione edificio 43	15 d																					
242	1.5.17.4	Gestione macerie/rottami	Frantumazione e messa in cumulo	23 d																					
243	1.6		<b>Fase 4</b>	<b>175 d</b>																					
244	1.6.1		<b>Edificio 49 A B C</b>	<b>60 d</b>																					
245	1.6.1.1	Rimozione rifiuti	Rimozione rifiuti ED 016	10 d																					
246	1.6.1.2	Strip out	Strip out ED 49 A B C	5 d																					
247	1.6.1.3	Bonifica MCA	Bonifica MCA ED A B C	20 d																					
248	1.6.1.4	Bonifica FAV	Bonifica FAV ED A B C	3 d																					
249	1.6.1.5	Demolizione	Demolizione edificio 49 A B C	8 d																					
250	1.6.1.6	Gestione macerie/rottami	Frantumazione e messa in cumulo	14 d																					
251	1.6.2		<b>Edificio 47 A B C</b>	<b>56 d</b>																					
252	1.6.2.1	Strip out	Strip out ED 47 A B C	10 d																					
253	1.6.2.2	Bonifica MCA	Bonifica MCA ED 47 A B C	15 d																					
254	1.6.2.3	Bonifica FAV	Bonifica FAV ED 47 A B C	2 d																					
255	1.6.2.4	Demolizione	Demolizione edificio 47 A B C	7 d																					

